
Maryland Pkwy RED LINE Remaining Work
Oct 1, 2026

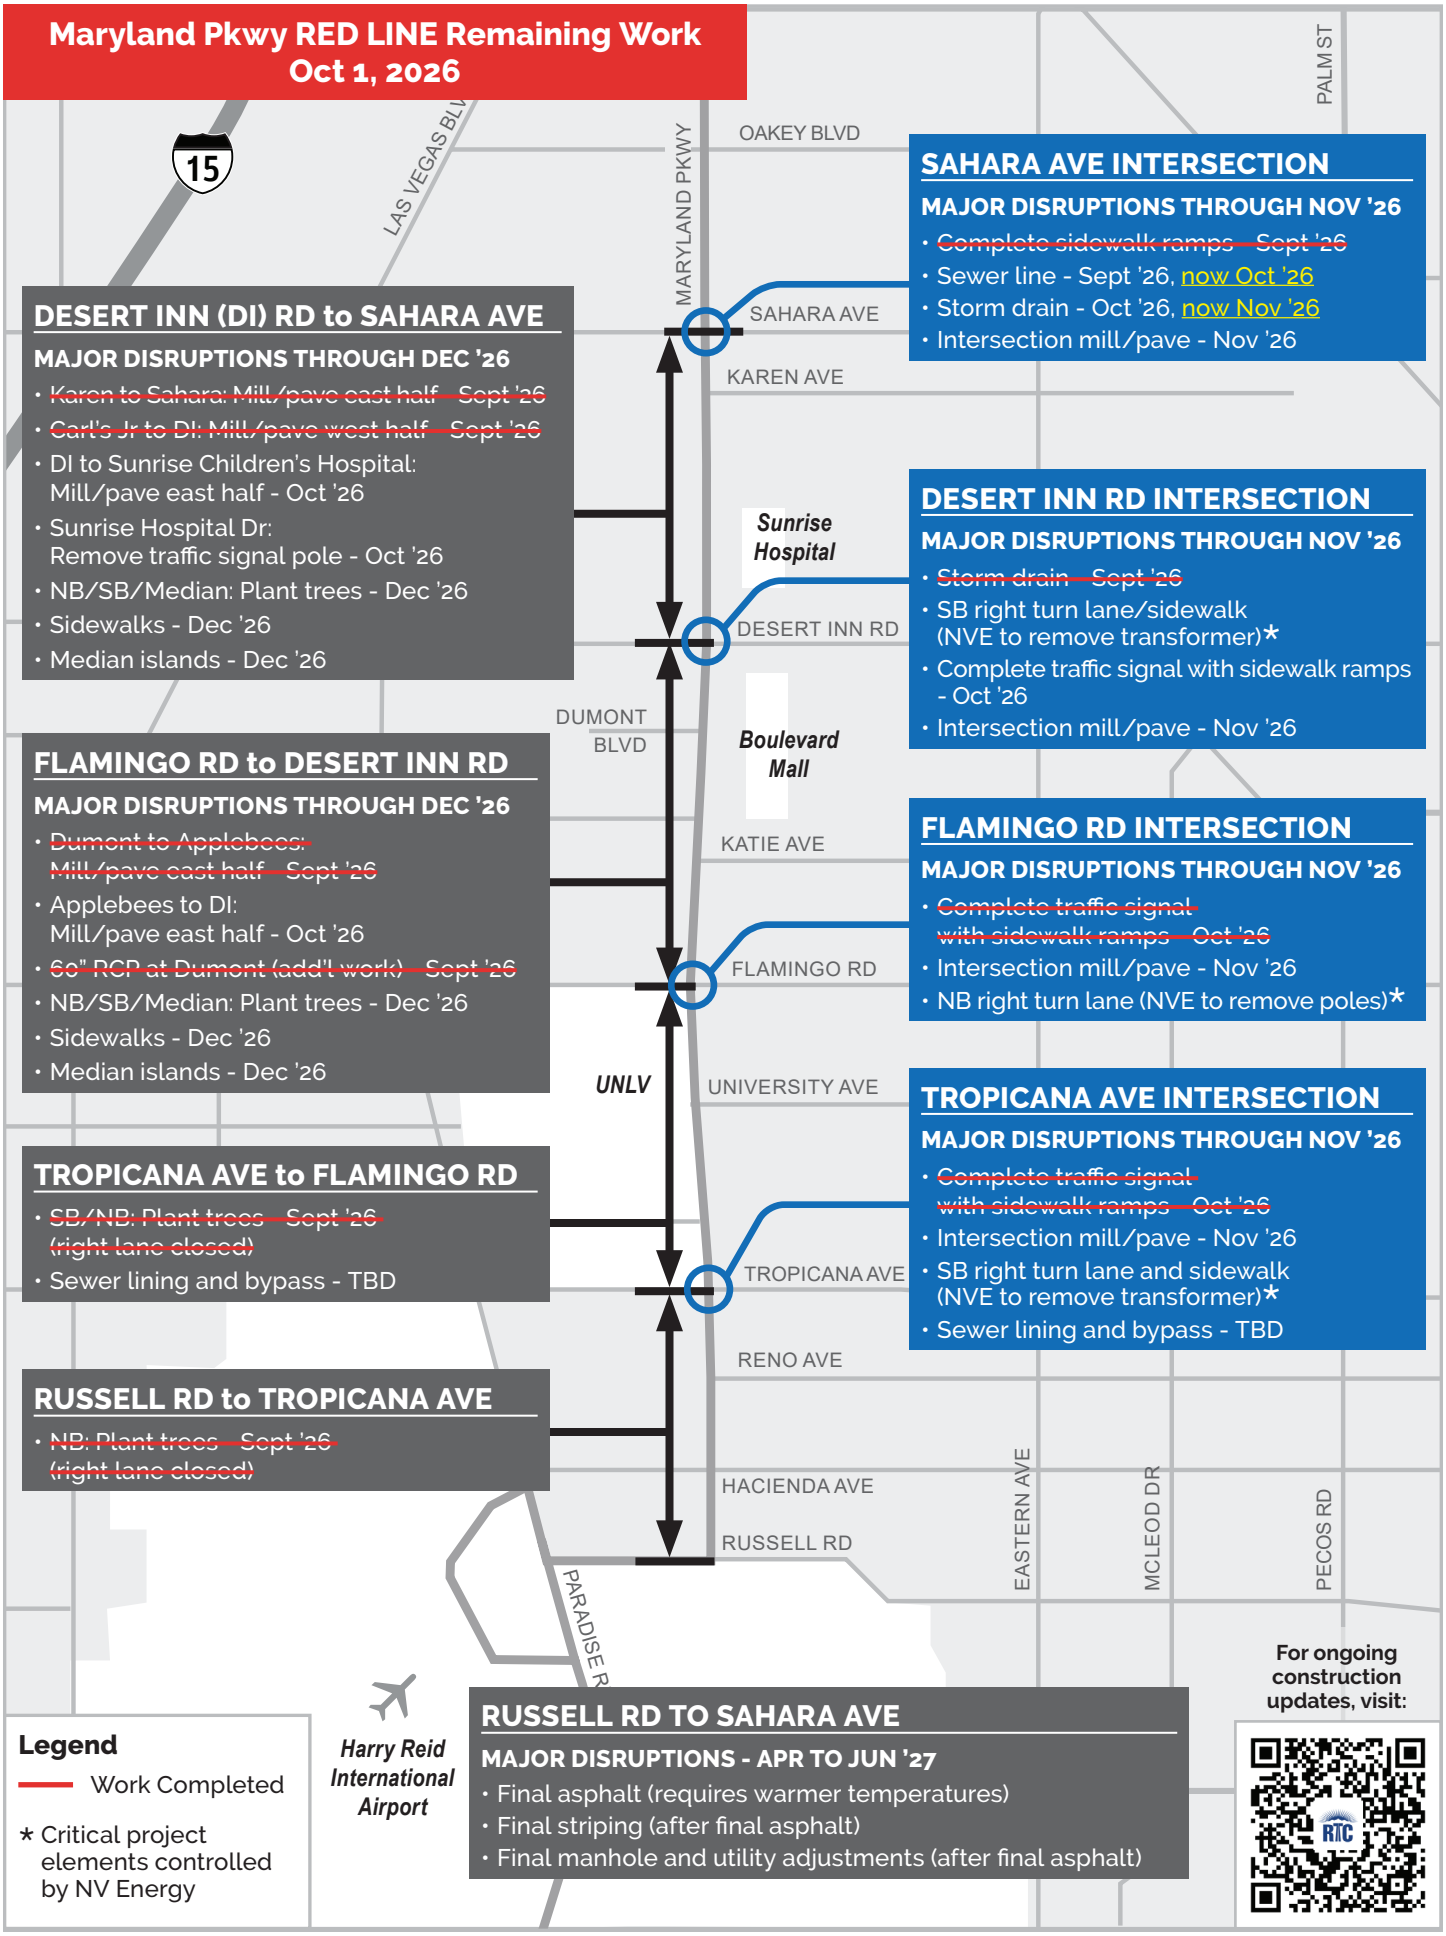

DESERT INN (DI) RD to SAHARA AVE

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- ~~Karen to Sahara: Mill/pave east half - Sept '26~~
- ~~Carl's Jr to DI: Mill/pave west half - Sept '26~~
- DI to Sunrise Children's Hospital: Mill/pave east half - Oct '26
- Sunrise Hospital Dr: Remove traffic signal pole - Oct '26
- NB/SB/Median: Plant trees - Dec '26
- Sidewalks - Dec '26
- Median islands - Dec '26

FLAMINGO RD to DESERT INN RD

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- ~~Dumont to Applebees: Mill/pave east half - Sept '26~~
- Applebees to DI: Mill/pave east half - Oct '26
- ~~6o" RCP at Dumont (add'l work) - Sept '26~~
- NB/SB/Median: Plant trees - Dec '26
- Sidewalks - Dec '26
- Median islands - Dec '26

TROPICANA AVE to FLAMINGO RD

- ~~SB/NB: Plant trees - Sept '26 (right lane closed)~~
- Sewer lining and bypass - TBD

RUSSELL RD to TROPICANA AVE

- ~~NB: Plant trees - Sept '26 (right lane closed)~~

SAHARA AVE INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Complete sidewalk ramps - Sept '26~~
- Sewer line - Sept '26, now Oct '26
- Storm drain - Oct '26, now Nov '26
- Intersection mill/pave - Nov '26

DESERT INN RD INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Storm drain - Sept '26~~
- SB right turn lane/sidewalk (NVE to remove transformer)*
- Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26
- Intersection mill/pave - Nov '26

FLAMINGO RD INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26~~
- Intersection mill/pave - Nov '26
- NB right turn lane (NVE to remove poles)*

TROPICANA AVE INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26~~
- Intersection mill/pave - Nov '26
- SB right turn lane and sidewalk (NVE to remove transformer)*
- Sewer lining and bypass - TBD

RUSSELL RD TO SAHARA AVE

MAJOR DISRUPTIONS - APR TO JUN '27

- Final asphalt (requires warmer temperatures)
- Final striping (after final asphalt)
- Final manhole and utility adjustments (after final asphalt)


Legend

~~Work Completed~~

* Critical project elements controlled by NV Energy

For ongoing construction updates, visit:

Trabajos Pendientesen la LÍNEA ROJA de Maryland Parkway
Oct 1, 2026

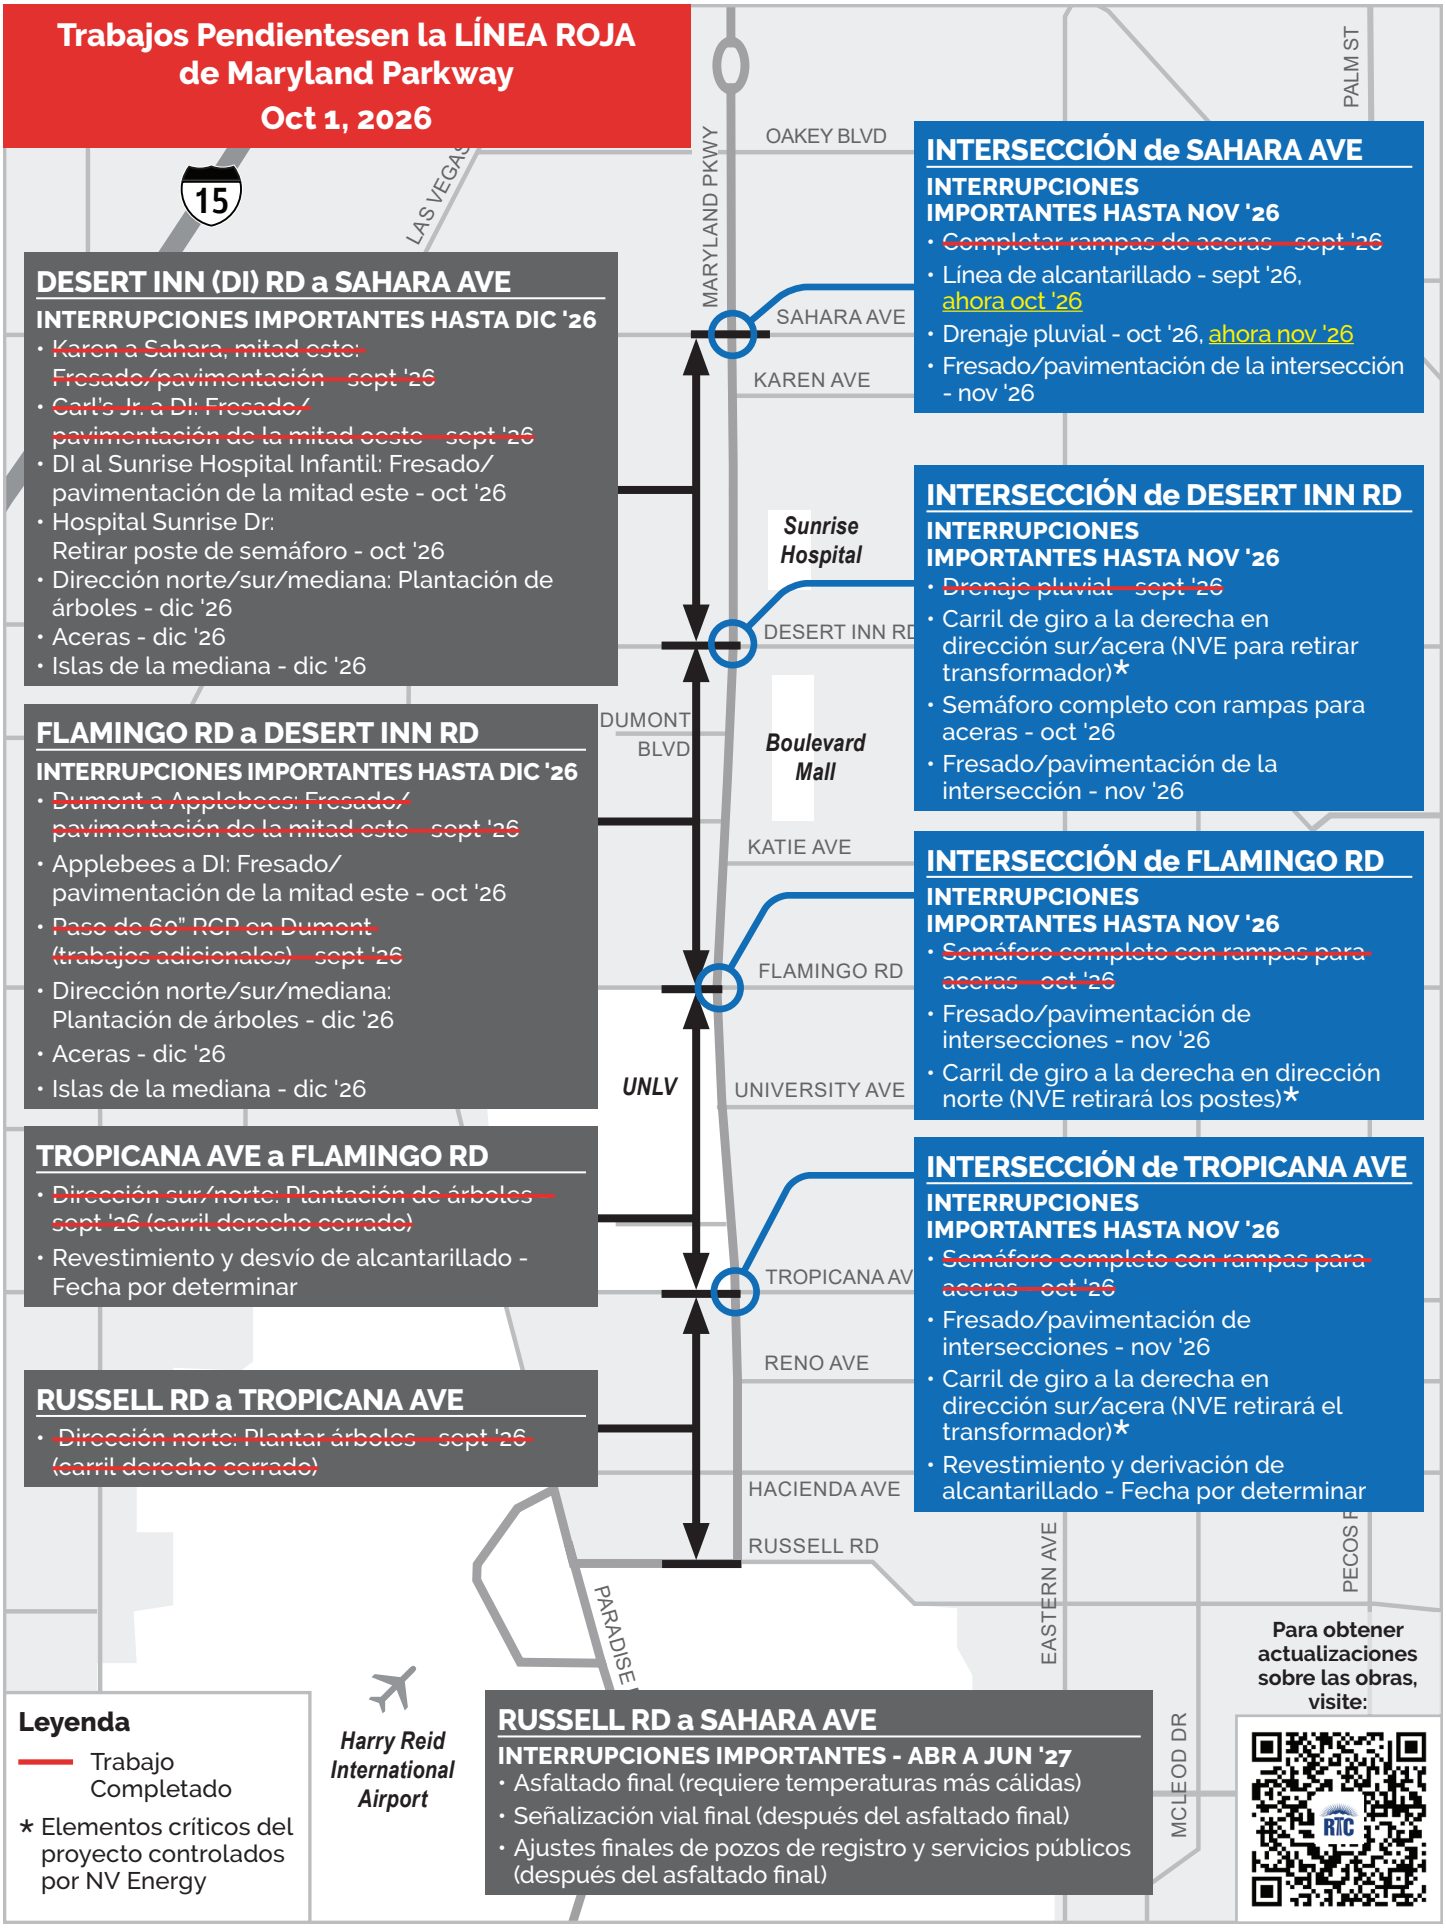

DESERT INN (DI) RD a SAHARA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA DIC '26
- ~~Karen a Sahara, mitad este: Fresado/pavimentación – sept '26~~
- ~~Carl's Jr. a DI: Fresado/pavimentación de la mitad oeste – sept '26~~
- DI al Sunrise Hospital Infantil: Fresado/pavimentación de la mitad este - oct '26
- Hospital Sunrise Dr: Retirar poste de semáforo - oct '26
- Dirección norte/sur/mediana: Plantación de árboles - dic '26
- Aceras - dic '26
- Islas de la mediana - dic '26

FLAMINGO RD a DESERT INN RD
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA DIC '26
- ~~Dumont a Applebees: Fresado/pavimentación de la mitad este – sept '26~~
- Applebees a DI: Fresado/pavimentación de la mitad este - oct '26
- ~~Paso de 60" RCP en Dumont (trabajos adicionales) – sept '26~~
- Dirección norte/sur/mediana: Plantación de árboles - dic '26
- Aceras - dic '26
- Islas de la mediana - dic '26

TROPICANA AVE a FLAMINGO RD
- ~~Dirección sur/norte: Plantación de árboles sept '26 (carril derecho cerrado)~~
- Revestimiento y desvío de alcantarillado - Fecha por determinar

RUSSELL RD a TROPICANA AVE
- ~~Dirección norte: Plantar árboles – sept '26 (carril derecho cerrado)~~

INTERSECCIÓN de SAHARA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26
- ~~Completar rampas de aceras – sept '26~~
- Línea de alcantarillado - sept '26, ahora oct '26
- Drenaje pluvial - oct '26, ahora nov '26
- Fresado/pavimentación de la intersección - nov '26

INTERSECCIÓN de DESERT INN RD
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26
- ~~Drenaje pluvial – sept '26~~
- Carril de giro a la derecha en dirección sur/acera (NVE para retirar transformador)*
- Semáforo completo con rampas para aceras - oct '26
- Fresado/pavimentación de la intersección - nov '26

INTERSECCIÓN de FLAMINGO RD
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26
- ~~Semáforo completo con rampas para aceras – oct '26~~
- Fresado/pavimentación de intersecciones - nov '26
- Carril de giro a la derecha en dirección norte (NVE retirará los postes)*

INTERSECCIÓN de TROPICANA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26
- ~~Semáforo completo con rampas para aceras – oct '26~~
- Fresado/pavimentación de intersecciones - nov '26
- Carril de giro a la derecha en dirección sur/acera (NVE retirará el transformador)*
- Revestimiento y derivación de alcantarillado - Fecha por determinar

RUSSELL RD a SAHARA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES - ABR A JUN '27
- Asfaltado final (requiere temperaturas más cálidas)
- Señalización vial final (después del asfaltado final)
- Ajustes finales de pozos de registro y servicios públicos (después del asfaltado final)

Leyenda
- ~~Trabajo Completado~~
- * Elementos críticos del proyecto controlados por NV Energy

Para obtener actualizaciones sobre las obras, visite:
