
Maryland Pkwy RED LINE Remaining Work
Oct 30, 2026

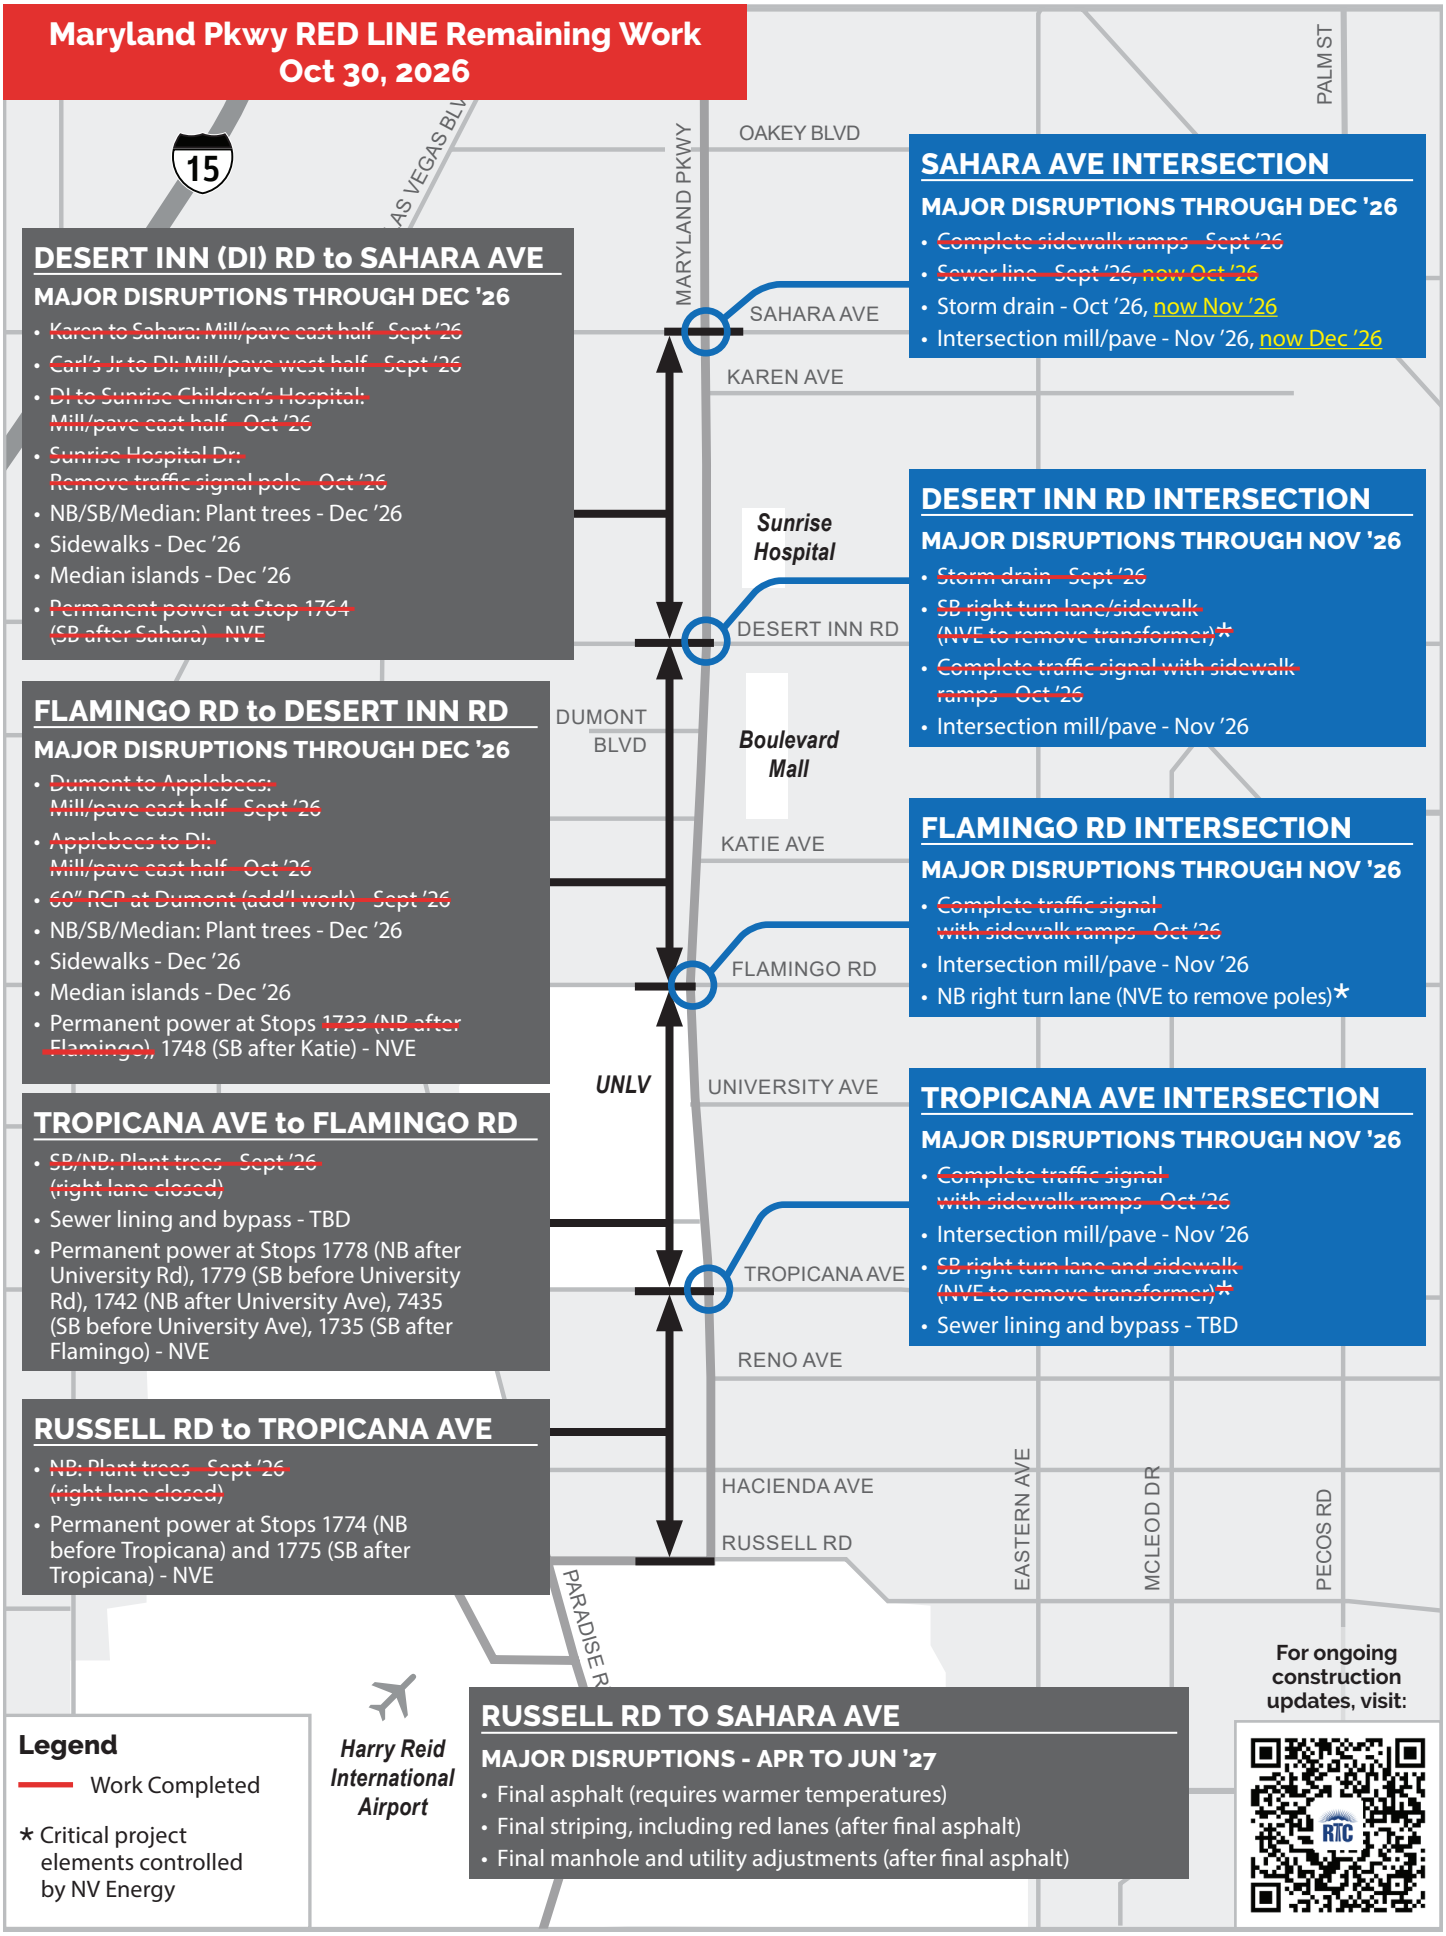

DESERT INN (DI) RD to SAHARA AVE

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- ~~Karen to Sahara: Mill/pave east half - Sept '26~~
- ~~Carl's Jr to DI: Mill/pave west half - Sept '26~~
- ~~DI to Sunrise Children's Hospital: Mill/pave east half - Oct '26~~
- ~~Sunrise Hospital Dr: Remove traffic signal pole - Oct '26~~
- NB/SB/Median: Plant trees - Dec '26
- Sidewalks - Dec '26
- Median islands - Dec '26
- ~~Permanent power at Stop 1764 (SB after Sahara) - NVE~~

FLAMINGO RD to DESERT INN RD

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- ~~Dumont to Applebees: Mill/pave east half - Sept '26~~
- ~~Applebees to DI: Mill/pave east half - Oct '26~~
- ~~60" RCP at Dumont (add'l work) - Sept '26~~
- NB/SB/Median: Plant trees - Dec '26
- Sidewalks - Dec '26
- Median islands - Dec '26
- Permanent power at Stops ~~1733 (NB after Flamingo)~~, 1748 (SB after Katie) - NVE

TROPICANA AVE to FLAMINGO RD

- ~~SB/NB: Plant trees - Sept '26 (right lane closed)~~
- Sewer lining and bypass - TBD
- Permanent power at Stops 1778 (NB after University Rd), 1779 (SB before University Rd), 1742 (NB after University Ave), 7435 (SB before University Ave), 1735 (SB after Flamingo) - NVE

RUSSELL RD to TROPICANA AVE

- ~~NB: Plant trees - Sept '26 (right lane closed)~~
- Permanent power at Stops 1774 (NB before Tropicana) and 1775 (SB after Tropicana) - NVE

SAHARA AVE INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- ~~Complete sidewalk ramps - Sept '26~~
- ~~Sewer line - Sept '26, now Oct '26~~
- Storm drain - Oct '26, now Nov '26
- Intersection mill/pave - Nov '26, now Dec '26

DESERT INN RD INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Storm drain - Sept '26~~
- ~~SB right turn lane/sidewalk (NVE to remove transformer)~~*
- ~~Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26~~
- Intersection mill/pave - Nov '26

FLAMINGO RD INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26~~
- Intersection mill/pave - Nov '26
- NB right turn lane (NVE to remove poles)*

TROPICANA AVE INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- ~~Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26~~
- Intersection mill/pave - Nov '26
- ~~SB right turn lane and sidewalk (NVE to remove transformer)~~*
- Sewer lining and bypass - TBD

RUSSELL RD TO SAHARA AVE

MAJOR DISRUPTIONS - APR TO JUN '27

- Final asphalt (requires warmer temperatures)
- Final striping, including red lanes (after final asphalt)
- Final manhole and utility adjustments (after final asphalt)


Legend

- Work Completed
- * Critical project elements controlled by NV Energy

Harry Reid International Airport

For ongoing construction updates, visit:

Trabajos Pendientesen la LÍNEA ROJA de Maryland Parkway
Oct 30, 2026

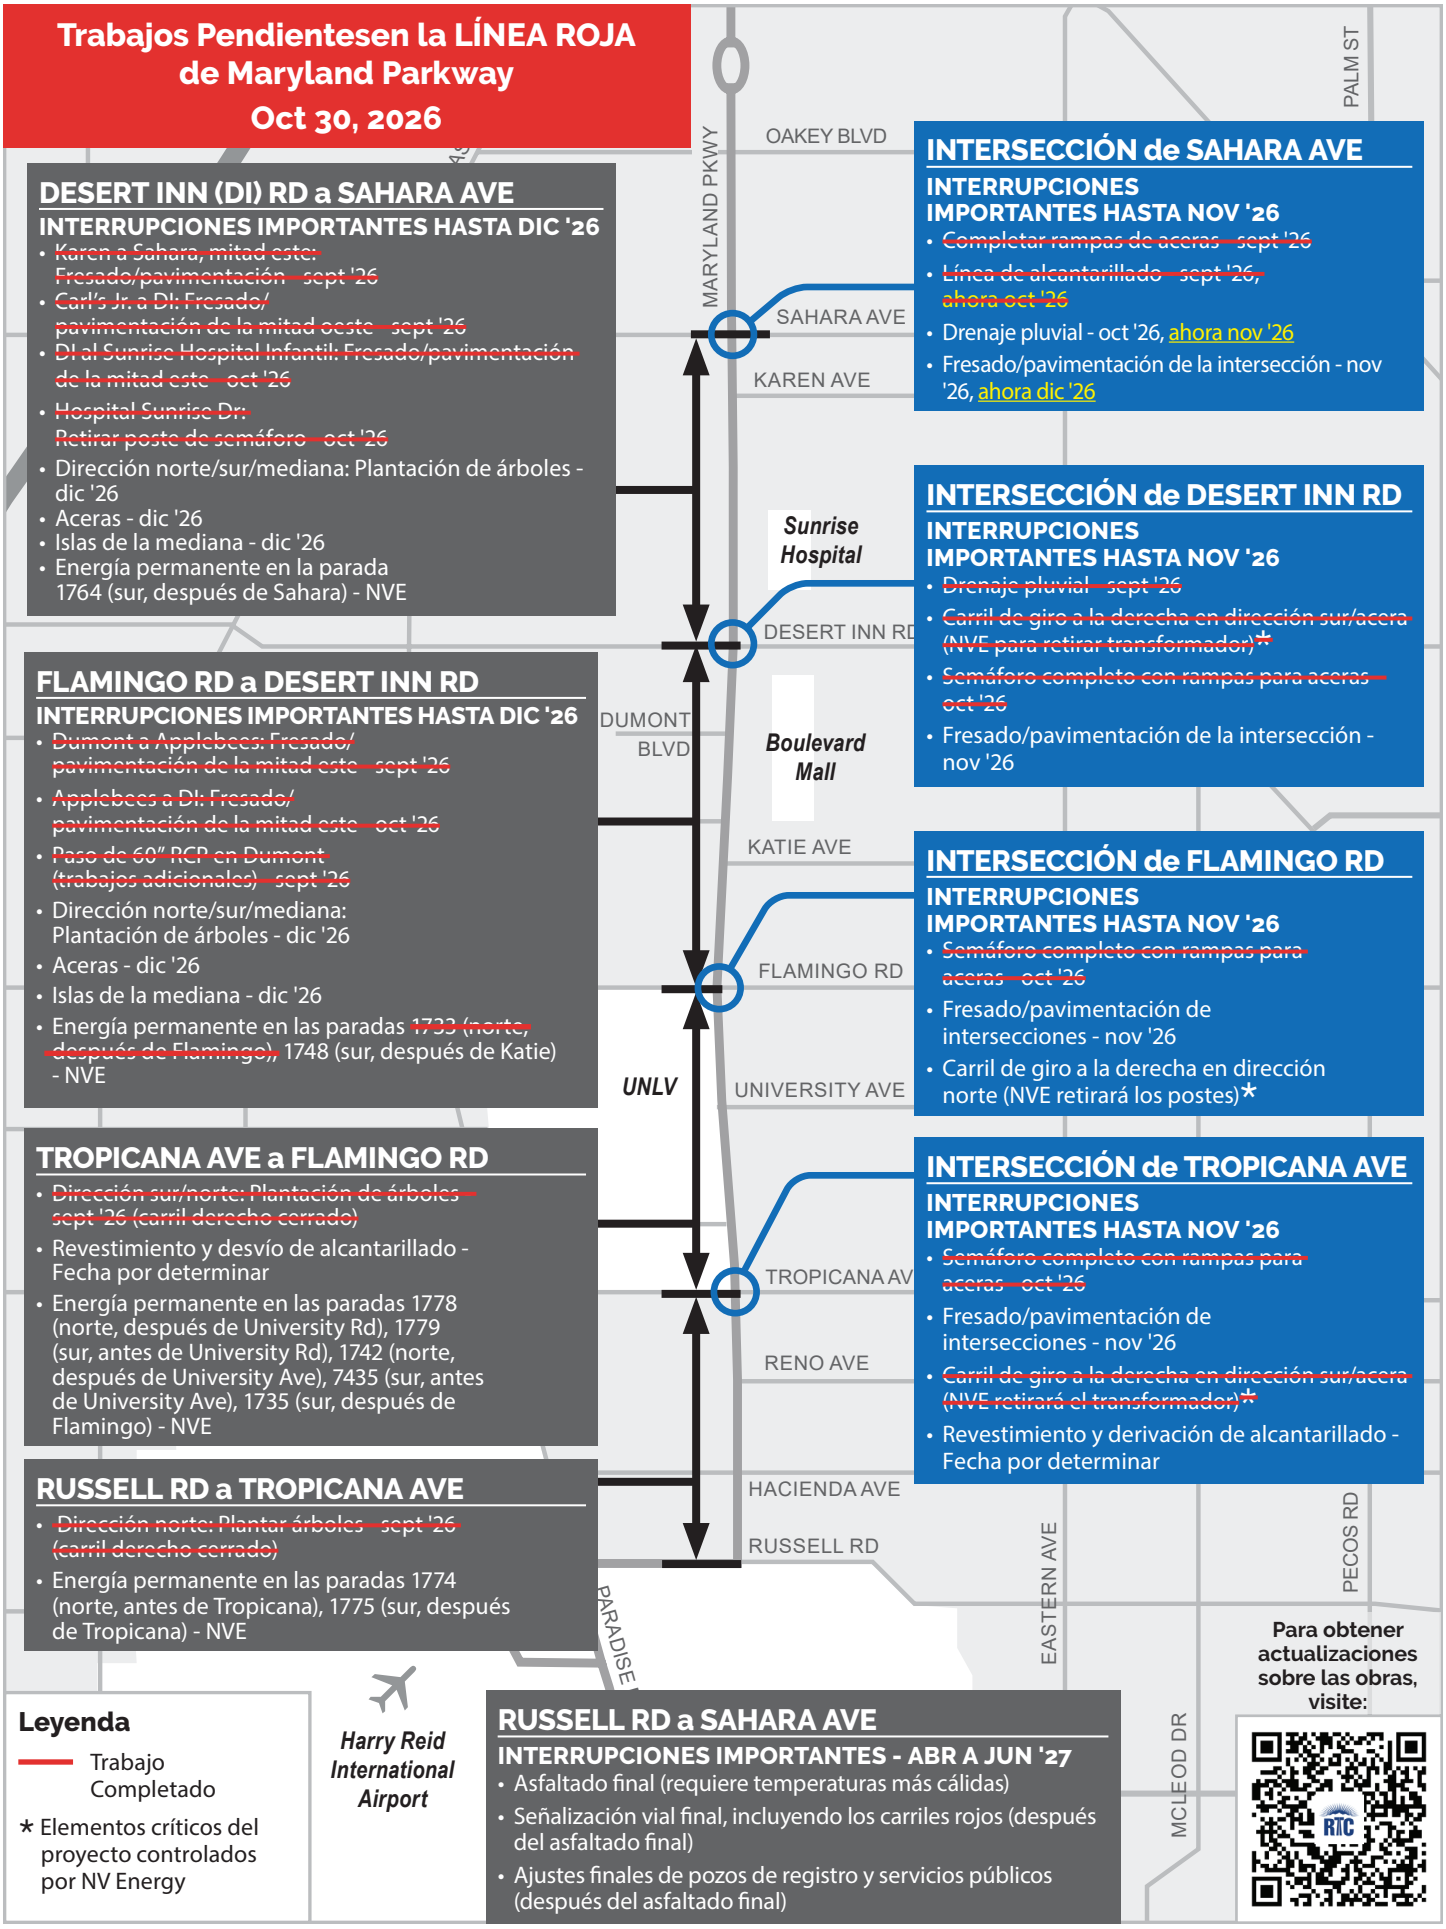

DESERT INN (DI) RD a SAHARA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA DIC '26

- ~~Karen a Sahara, mitad este: Fresado/pavimentación - sept '26~~
- ~~Carl's Jr. a DI: Fresado/pavimentación de la mitad oeste - sept '26~~
- ~~DI al Sunrise Hospital Infantil: Fresado/pavimentación de la mitad este - oct '26~~
- ~~Hospital Sunrise Dr: Retirar poste de semáforo - oct '26~~
- Dirección norte/sur/mediana: Plantación de árboles - dic '26
- Aceras - dic '26
- Islas de la mediana - dic '26
- Energía permanente en la parada 1764 (sur, después de Sahara) - NVE

FLAMINGO RD a DESERT INN RD
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA DIC '26

- ~~Dumont a Applebees: Fresado/pavimentación de la mitad este - sept '26~~
- ~~Applebees a DI: Fresado/pavimentación de la mitad este - oct '26~~
- ~~Paso de 60" RCP en Dumont (trabajos adicionales) - sept '26~~
- Dirección norte/sur/mediana: Plantación de árboles - dic '26
- Aceras - dic '26
- Islas de la mediana - dic '26
- Energía permanente en las paradas ~~1733 (norte, después de Flamingo),~~ 1748 (sur, después de Katie) - NVE

TROPICANA AVE a FLAMINGO RD

- ~~Dirección sur/norte: Plantación de árboles sept '26 (carril derecho cerrado)~~
- Revestimiento y desvío de alcantarillado - Fecha por determinar
- Energía permanente en las paradas 1778 (norte, después de University Rd), 1779 (sur, antes de University Rd), 1742 (norte, después de University Ave), 7435 (sur, antes de University Ave), 1735 (sur, después de Flamingo) - NVE

RUSSELL RD a TROPICANA AVE

- ~~Dirección norte: Plantar árboles - sept '26 (carril derecho cerrado)~~
- Energía permanente en las paradas 1774 (norte, antes de Tropicana), 1775 (sur, después de Tropicana) - NVE

INTERSECCIÓN de SAHARA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- ~~Completar rampas de aceras - sept '26~~
- ~~Línea de alcantarillado - sept '26, ahora oct '26~~
- Drenaje pluvial - oct '26, ahora nov '26
- Fresado/pavimentación de la intersección - nov '26, ahora dic '26

INTERSECCIÓN de DESERT INN RD
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- ~~Drenaje pluvial - sept '26~~
- ~~Carril de giro a la derecha en dirección sur/acera (NVE para retirar transformador)*~~
- ~~Semáforo completo con rampas para aceras oct '26~~
- Fresado/pavimentación de la intersección - nov '26

INTERSECCIÓN de FLAMINGO RD
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- ~~Semáforo completo con rampas para aceras - oct '26~~
- Fresado/pavimentación de intersecciones - nov '26
- Carril de giro a la derecha en dirección norte (NVE retirará los postes)*

INTERSECCIÓN de TROPICANA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- ~~Semáforo completo con rampas para aceras - oct '26~~
- Fresado/pavimentación de intersecciones - nov '26
- ~~Carril de giro a la derecha en dirección sur/acera (NVE retirará el transformador)*~~
- Revestimiento y derivación de alcantarillado - Fecha por determinar

RUSSELL RD a SAHARA AVE
INTERRUPCIONES IMPORTANTES - ABR A JUN '27

- Asfaltado final (requiere temperaturas más cálidas)
- Señalización vial final, incluyendo los carriles rojos (después del asfaltado final)
- Ajustes finales de pozos de registro y servicios públicos (después del asfaltado final)

Leyenda

- ~~Trabajo Completado~~
- * Elementos críticos del proyecto controlados por NV Energy

Harry Reid International Airport

Para obtener actualizaciones sobre las obras, visite:
